CRONOPROGRAMMA CAMPO DELLA MODIFICAZIONE m1_8

DATA: 22/09/2016
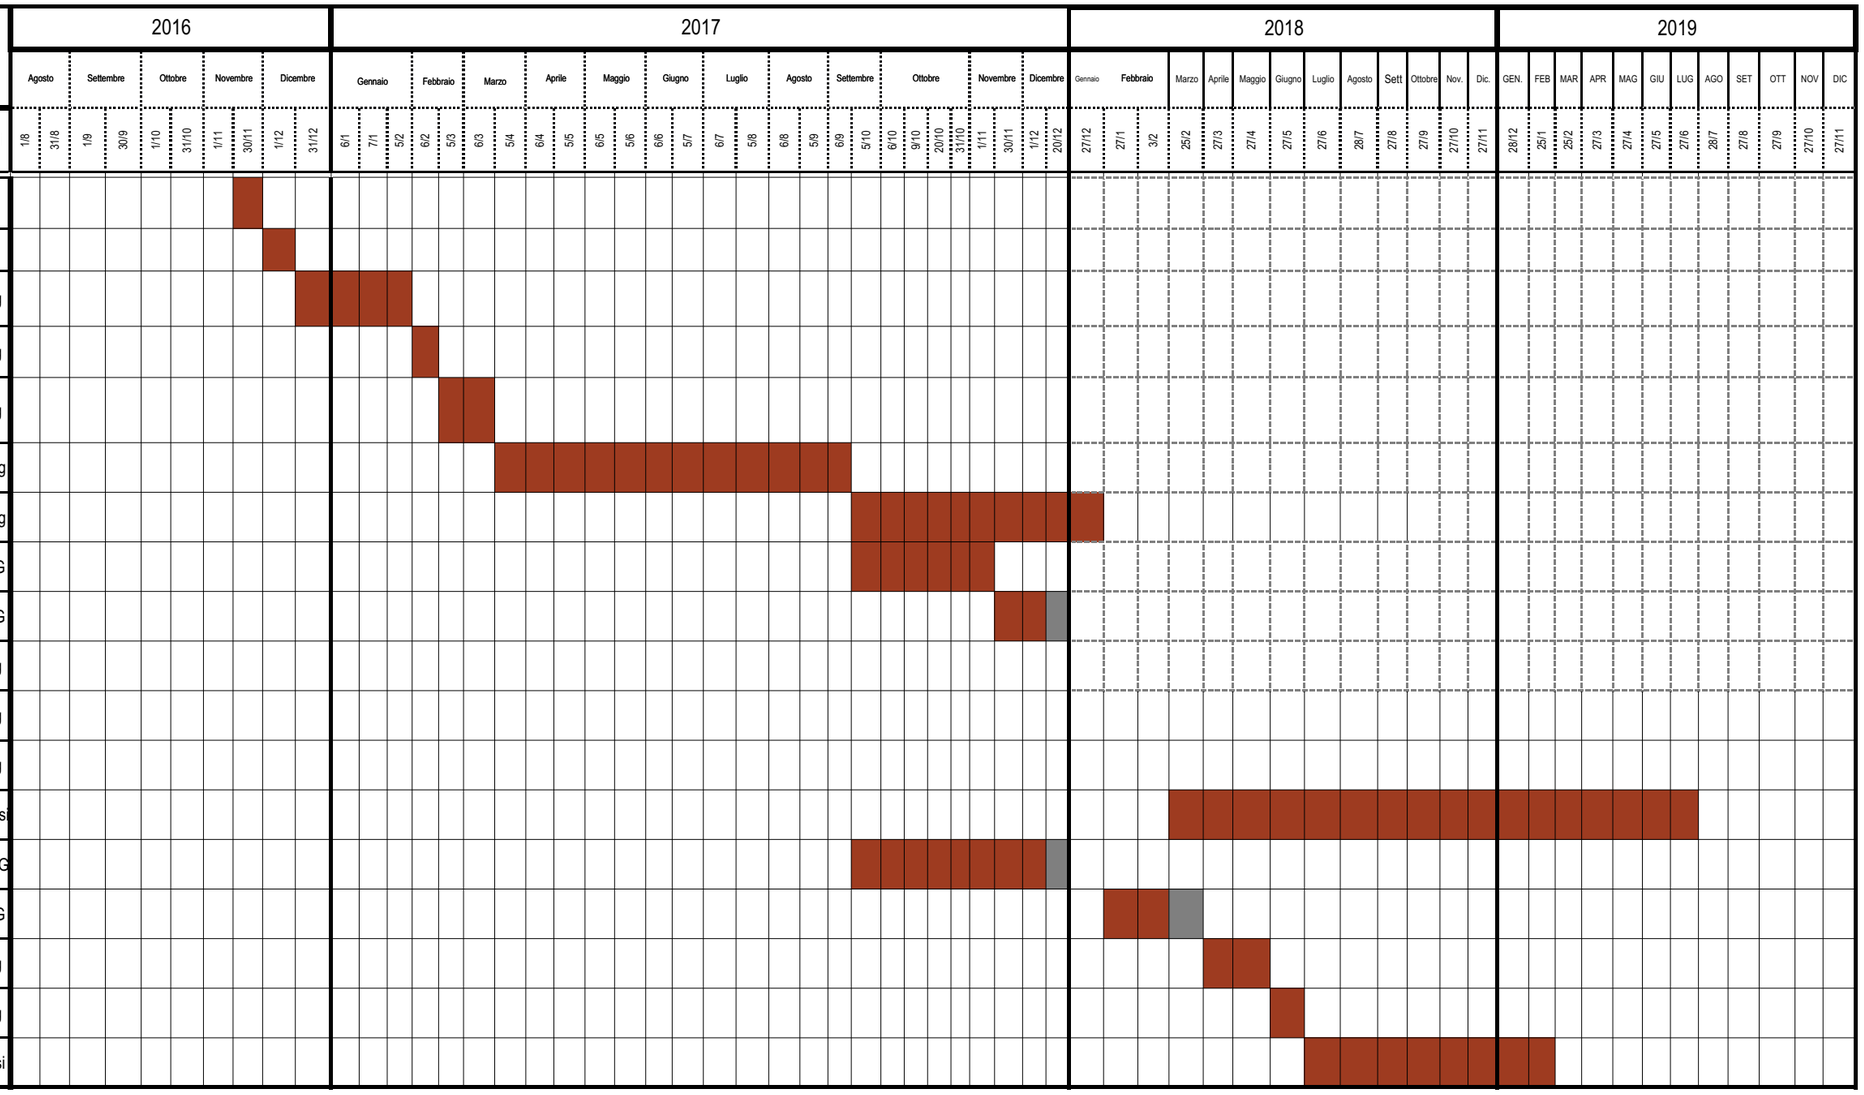
	Attività	inizio	fine	mesi
1	ADOZIONE P.A.	30/11/16	30/11/16	
2	Deposito atti	01/12/16	06/12/16	5 gg
3	Avviso di deposito atti a libera visione - presentazione osservazioni (30gg + 30 gg)	07/12/16	05/02/17	60 gg
4	Controdeduzioni Osservazioni e riscontro pareri	06/02/17	21/02/17	15 gg
5	APPROVAZIONE P.A	22/02/17	09/03/17	15 gg
6	STIPULA CONVENZIONE	10/03/17	06/09/17	180 gg
7	Presentazione 1° Pdc	07/09/17	05/01/18	120 gg
8	Presentazione progetti def./es. OUP	07/09/17	06/11/17	60 GG
9	Validazione e Approvazione progetti OUP	07/11/17	06/01/18	60 GG
10	Comunicazione avvalimento	07/01/18	17/01/18	10 gg
11	Verifiche Comune	18/01/18	28/01/18	10 gg
12	Inizio lavori OUP	29/01/18	08/02/18	10 gg
13	Fine Lavori OUP	09/02/18	03/08/19	18 mesi
14	Presentazione progetto def./es.OUS da parte dell' operatore	07/09/17	05/01/18	120 GG
15	Validazione e approvazione prog. Def/Es. OUS	06/01/18	07/03/18	60 GG
16	Indizione gara e stipula contratto OUS da parte del Comune	08/03/18	07/05/18	60 gg
17	Inizio lavori OUS	08/05/18	07/06/18	30 gg
18	Fine Lavori OUS	08/06/18	03/02/19	8 mesi
